

Фактические результаты проекта:

В соответствии с заключенным договором, срок исполнения договора 26.02.2019. На дату предоставления предварительного отчета по проекту выполнены следующие виды работ:


- демонтажные работы – 75%;
- усиление плит перекрытий – 45%;
- устройство перегородок из гипсокартона – 75%;
- усиление дверных проемов – 20%;
- работы по устройству системы вентиляции (пробивка перекрытий под вентиляционные каналы) – 60%;
- работы по внутреннему электроснабжению – 50%;
- работы по устройству хозяйственно-питьевого водопровода – 20%;

В процессе производства работ выявлен ряд объемов работ, которые не были учтены проектно-сметной документацией, а также выявлен ряд дополнительных работ, выполнение которых необходимо для полной реализации проекта. Совместная комиссия, включающая специалистов Заказчика и Подрядчика, произвела осмотр объекта, уточнила дополнительные объемы и виды работ. Подготовлено дополнительное соглашение о внесении изменений в договор. Направлено обращение к разработчику проекта ООО «Стройпортал» с перечнем недоработок, и изменений, которые подлежат внесению в проектно-сметную документацию.


На период с 01.12.2018 по 26.02.2019 предполагается выполнение следующих работ:

- завершение демонтажных работ, работ по усилению плит перекрытия и дверных проемов;
- завершение устройства перегородок из гипсокартона;
- завершение работ по устройству системы вентиляции, внутреннего электроснабжения и хозяйственно-питьевого водопровода;
- выполнение отделочных работ;
- устройство системы канализации;
- устройство системы отопления;
- устройство ограждения кровли и пожарных лестниц;
- заполнение дверных проемов Монтаж оборудования для маломобильных групп населения;
- благоустройство территории;
- закупка оборудования и инвентаря.


Приложение к отчету о реализации проекта «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания студентов, в том числе создание условий доступной среды, в здании Казармы №2 (Общежитие №7) с кадастровым номером 91:04:003020:141 по адресу г. Севастополь, ул. Курчатова, 7 распределенного университетского кампуса северной локации университета. (Шифр проекта ПР/1030-1/2018).

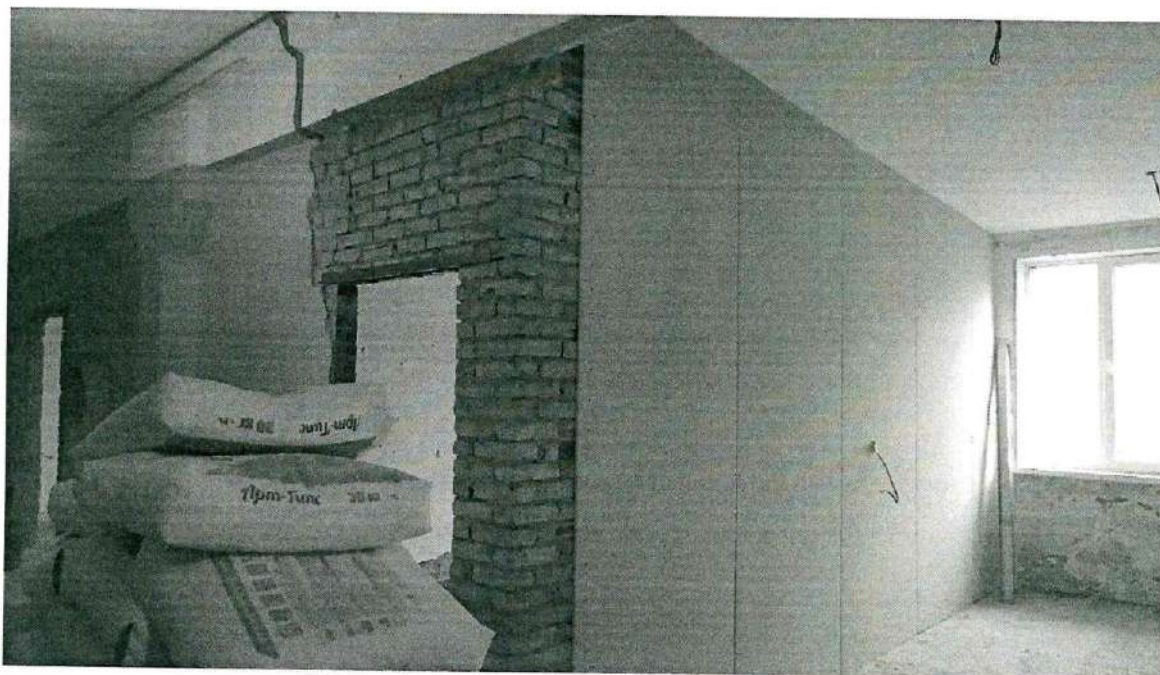

Устройство перегородок из гипсокартона.

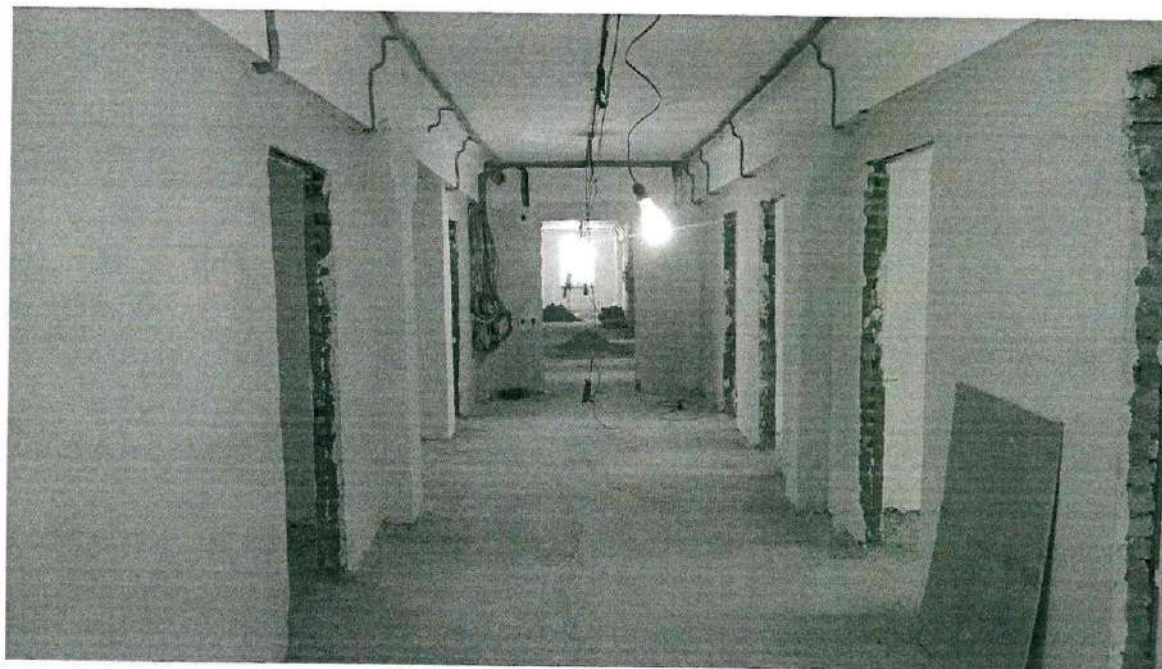


Работы по электроснабжению.

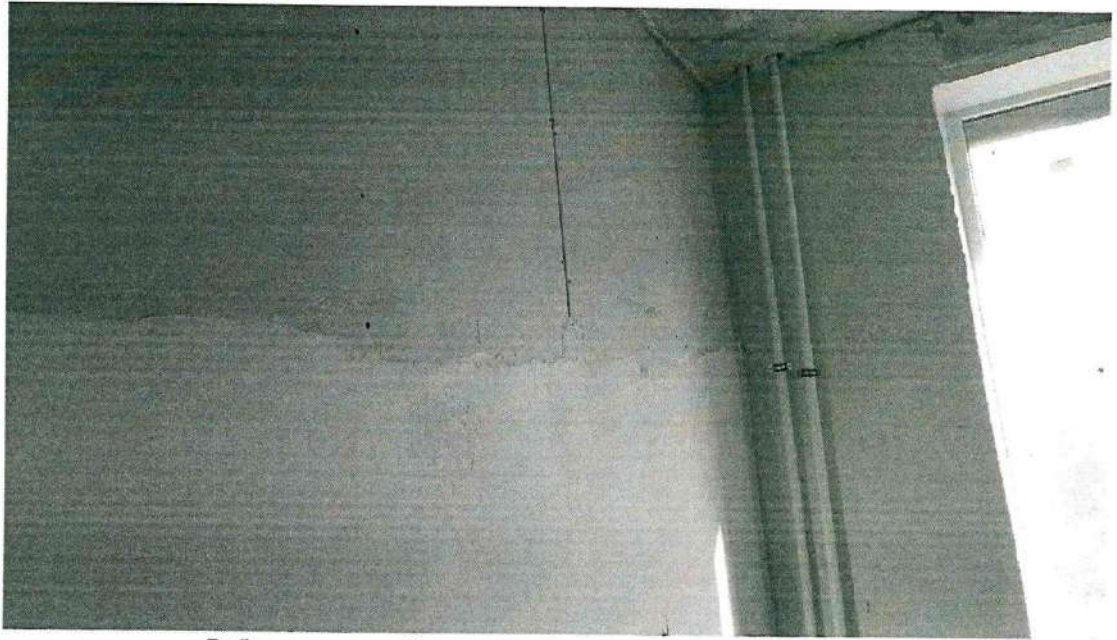

Работы по устройству перегородок и системы отопления.




Работы по усилению перекрытий.

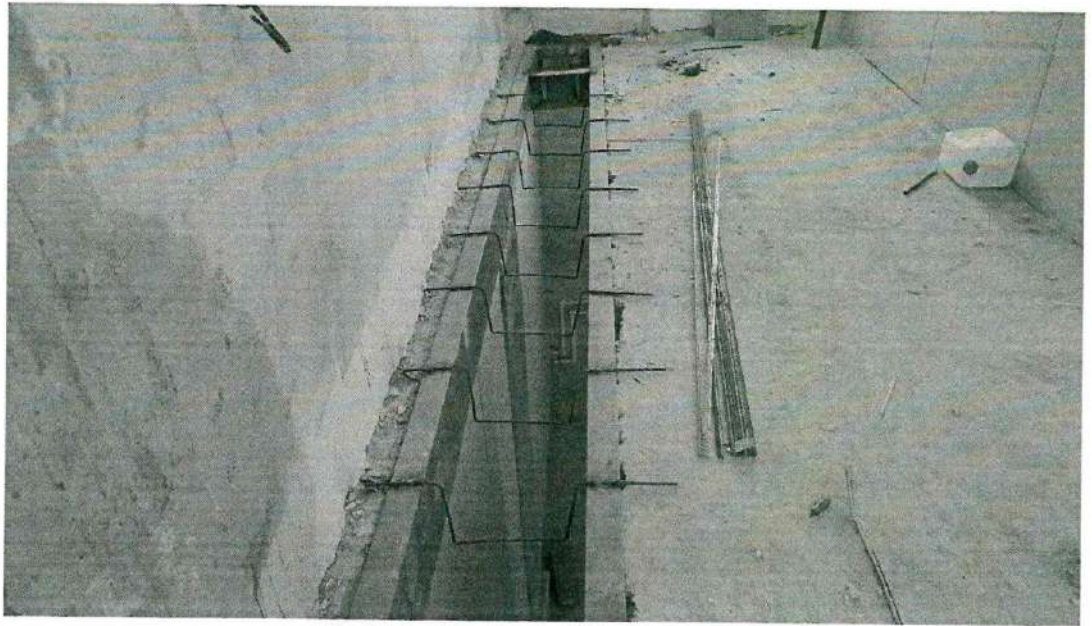

Работы по устройству вентканалов.



Работы по устройству отопления.

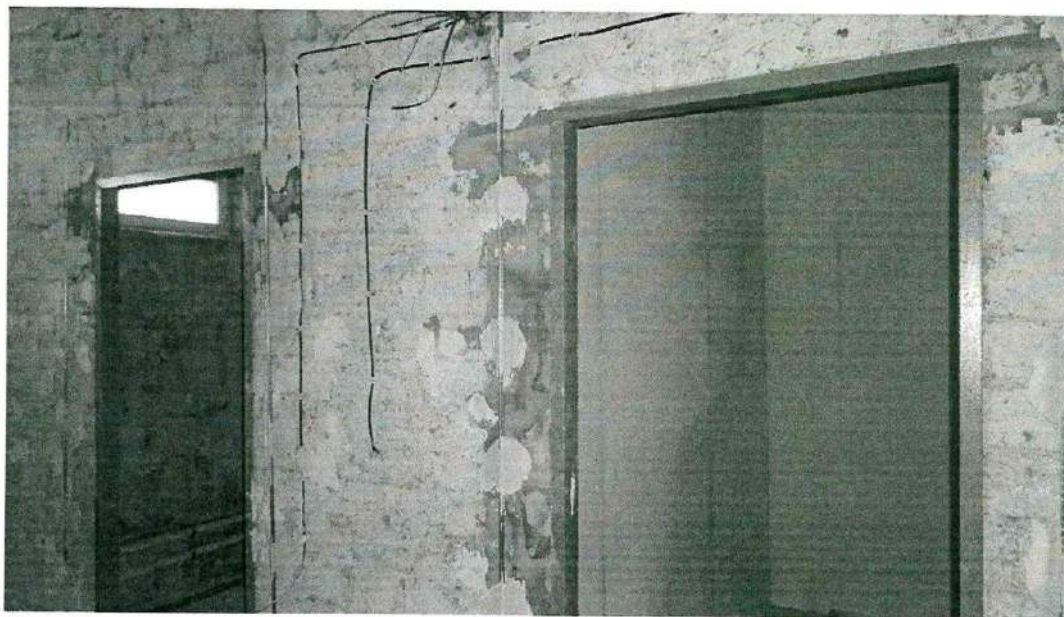

Работы по усилению дверных проемов.
